

# 建設委員会情報連絡【追加】

令和3年3月12日

情報連絡件名	頁
(1) 【追加】都市計画道路補助第136号線（関原・梅田）の交通開放 について . . . . .	2
(2) 【追加】下水道再構築工事の完了時期の延伸について . . . . .	4


(都市建設部)

## 建設委員会情報連絡

令和3年3月12日


件名	【追加】都市計画道路補助第136号線（関原・梅田）の交通開放について
所管部課名	都市建設部企画調整課 建設事業調整担当課
内容	<p>東京都施行都市計画道路補助第136号線（関原・梅田）の交通開放について、以下のとおり報告する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 路線名 東京都市計画道路補助第136号線</li> <li>2 交通開放区間 足立区関原一丁目～梅田三丁目</li> <li>3 交通開放日時 令和3年3月29日（月） 午後2時00分</li> <li>4 事業概要 別紙「案内図及び標準横断図」参照 P3</li> </ol> <p>（1）事業の目的及び効果 当該区間の交通開放により、木造密集地域である足立区関原・梅田地区の防災性の向上に寄与するとともに、東西方向の交通の円滑化が図られる。</p> <p>（2）事業期間 関原区間 平成3年度～令和3年度 梅田区間 平成11年度～令和4年度</p> <p>（3）交通開放の事業延長及び標準幅員 ア 事業延長 約1.1km イ 標準幅員 20m（2車線）</p>
問題点 今後の方針	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開通式典は行わない。

案内図

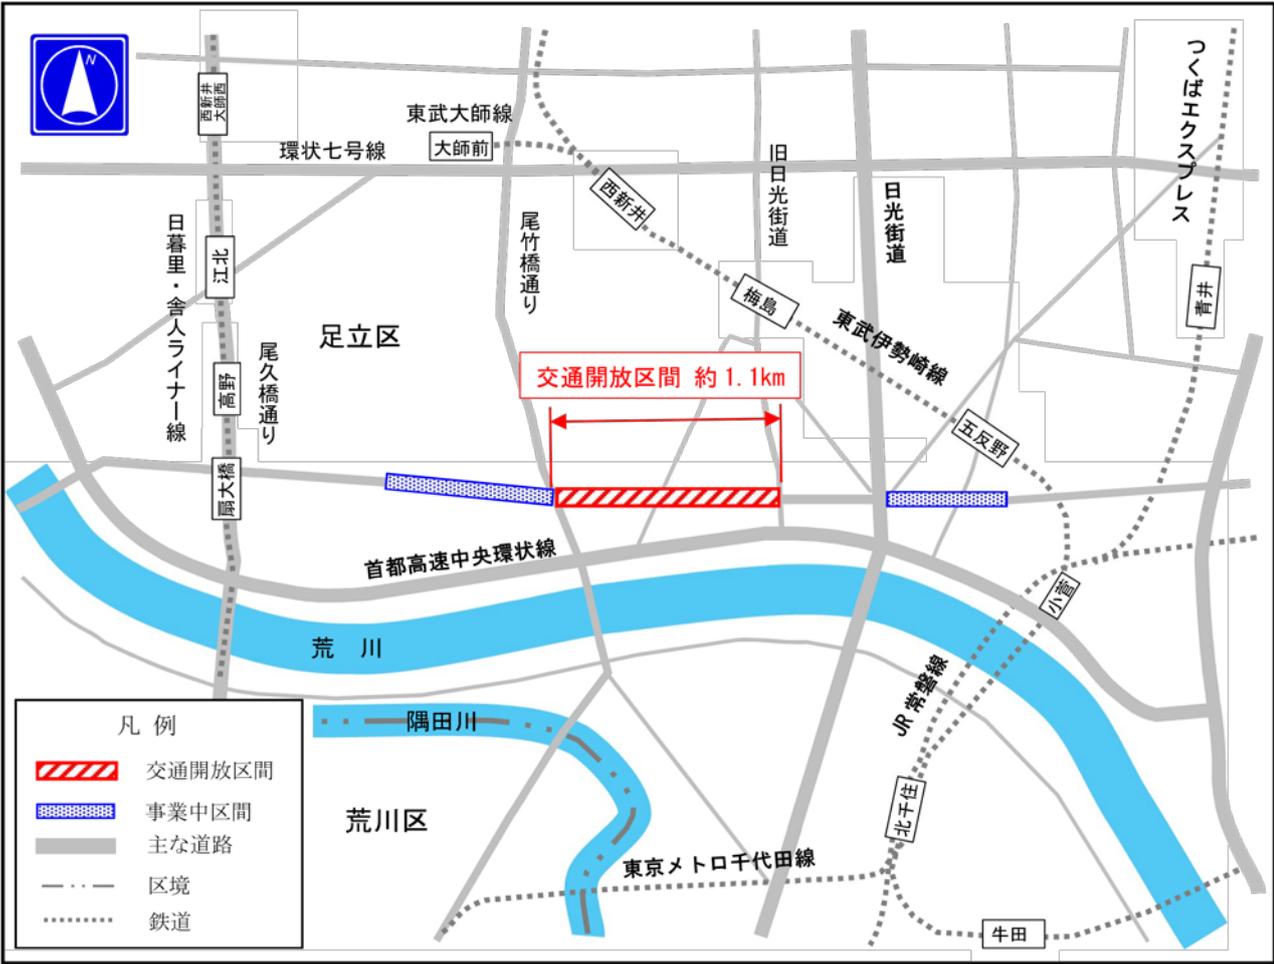

標準横断図

旧日光街道付近より西側方面を望む  
(令和3年2月撮影)

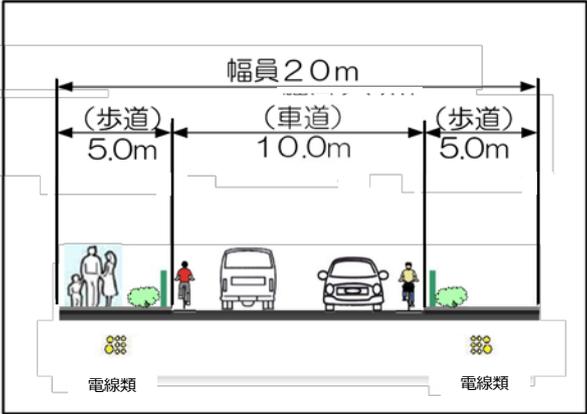

• 植栽及び自転車通行空間は、別途施工

## 建設委員会情報連絡

令和3年3月12日


件名	【追加】下水道再構築工事の完了時期の延伸について
所管部課名	都市建設部企画調整課 建設事業調整担当課
内 容	<p>東京都下水道局施行の足立区千住仲町、千住河原町付近の下水道再構築工事の完了時期の延伸について、以下のとおり報告する。</p> <p>1 対象工事 足立区千住仲町、千住河原町付近の下水道再構築工事 (別紙参照 P 5)</p> <p>2 工期の延伸 工事の完了時期が当初の令和3年度当初から令和4年度当初まで、下記2点の理由により約1年間延伸する。</p> <p>(1) 工事影響範囲内の既存ガス管に対する安全対策の検討 約3か月</p> <p>(2) 新設下水道管渠の接続先となる暫定貯留管の清掃作業の実施 約9か月</p>
問題点 今後の方針	本件に関する周辺住民に対しての丁寧な説明を下水道局に求めている。

# 足立区千住仲町、千住河原町付近再構築工事の完了時期について（延伸）

別紙

令和3年3月  
東京都下水道局  
第一基幹施設再構築事務所工事第一課

## 1 事業内容

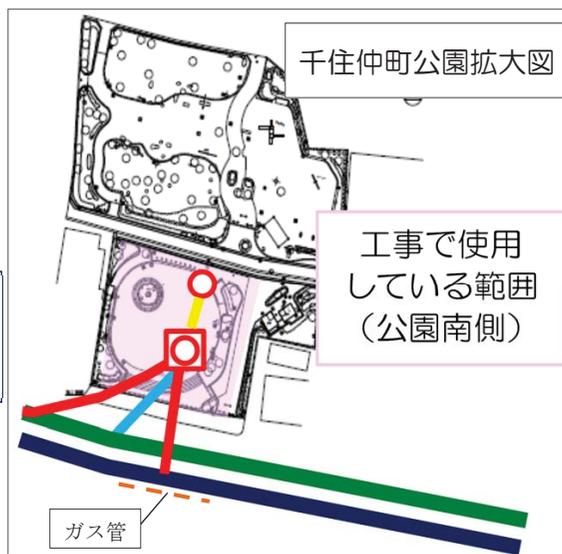

## 2 完了時期の見直しについて

これまで千住地区では、浸水被害が頻発した地域について、主要枝線（内径 3250 mm）を先行的に整備し、雨水を暫定貯留することで浸水被害の軽減を図ってきました。今回、千住仲町の一部も含めた流域の雨水を隅田川幹線に流下させる管きよを整備して、雨水整備水準を向上（50mm/hr -50% ⇒ 50mm/hr -80%）させますが、以下の理由により、**約1年間工期を延伸する**必要があります。

- 1 新設管きよ内径 2400 mmを布設する路線上に古いガス管が埋設されており、工事中の影響や安全対策の検討に時間を要した。（約3ヵ月間）
- 2 新設管きよ内径 2200 mmが接続する（○の箇所）暫定貯留管内径 3250 mm内には、雨水と一緒に流れ込んだ土砂が堆積しており、管内清掃に時間を要した。（約9ヵ月間）

	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
準備工	■				
管布設工	■	■	■	■	
人孔築造工		■	■	■	
公園復旧工			■		■

【凡例】  
 ■ : 当初工程  
 ■ : 変更工程

## 3 お問い合わせ先

東京都下水道局 第一基幹施設再構築事務所 工事第一課

電話番号 03-3862-8244
