

東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業 鉄道高架化工事のお知らせ

工事工程予定表

別添資料

平成28年10月19日
東武鉄道竹ノ塚工事事務所

《Ⅰ工区》

引き続き、下り緩行線高架橋の基礎杭工事(昼夜間)と桁架設工事(昼夜間)を行います。
また、10月中旬から下り緩行線高架橋の躯体工事(昼夜間)を行う予定です。

《Ⅱ工区》

都営伊興町第2アパート3号棟からエミエルタワーにかけて、下り緩行線高架橋の基礎杭工事(昼間)を行います。

また、工事の進捗に伴い、冬頃に2箇所の歩道橋(大踏切脇と伊興大境保育園前)が使用できなくなります。代替ルートとして、駅北側に仮設地下自由通路が開通し、東西の行き来ができるようになります。

《Ⅲ工区》

引き続き、仮設地下自由通路工事として、自由通路部の建築工事(昼夜間)を行い、新たにコンコース部地下通路の掘削工事(昼夜間)を開始します。また、下り緩行線高架橋の基礎杭工事(昼間)、38号踏切移設工事(昼夜間)および仮ホーム新設工事(昼間)を行います。

工事の進捗に伴い、現在の38号踏切(小踏切)が仮ホームの支障となるため、11月末頃に踏切を谷塚方へ移設します。移設後は、現在よりも幅員が狭くなるため、歩行者・自転車専用となります。

《Ⅳ工区》

下り緩行線高架橋の基礎杭工事(昼間)、地中梁工事(昼間)および引上げ線の軌道低下工事(夜間)を行います。

工事概要		10月		11月		12月		連絡先
Ⅰ工区	高架橋工事(基礎杭工)	基礎杭工(昼夜間)						東急・東武JV TEL 03-3858-3501
	〃 (躯体工)		掘削工・土留工・地中梁工・柱工(昼夜間)					
	〃 (桁架設工)	桁架設工(昼夜間)						
Ⅱ工区	高架橋工事(基礎杭工)	基礎杭工(昼間)						大成・東武JV TEL 03-5838-1033
	〃 (躯体工)			鋼矢板圧入・掘削工(昼間)		高架橋構築(昼間)		
Ⅲ工区	①仮設地下自由通路工事	<自由通路部> 建築工事(昼夜間)						鹿島・東武谷内田 ・熊谷・東鉄JV TEL 03-5809-5450
	〃	<コンコース部地下通路> 掘削・地盤改良工事 他(昼夜間)						
	高架橋工事		高架橋 基礎杭工・地中梁工・柱構築工(昼間)					
	②支障物移設工事	37号踏切付近支障物移設工事(昼夜間)						
	③38号踏切移設工事	軌道工事(夜間)			踏切新設、支障物移設(昼夜間)			
	④仮ホーム新設工事				仮ホーム新設(昼間)			
Ⅳ工区	高架橋工事(基礎杭工)	鋼矢板圧入、基礎杭工(昼間)						大林・東武・鉄建 ・戸田JV TEL 03-5647-8657
	〃 (躯体工)			地中梁工(昼間)				
	軌道低下工事	軌道低下工事(夜間)						

騒音・振動の抑制に努めるとともに、事故のないよう安全第一で、工事を進めてまいります。また、夜間作業の予定は事前にチラシ等で周知させていただきます。



①Ⅱ工区基礎杭工事状況




②仮設地下自由通路工事状況



③Ⅲ工区橋上駅舎仮受鋼材設置状況

全体平面図

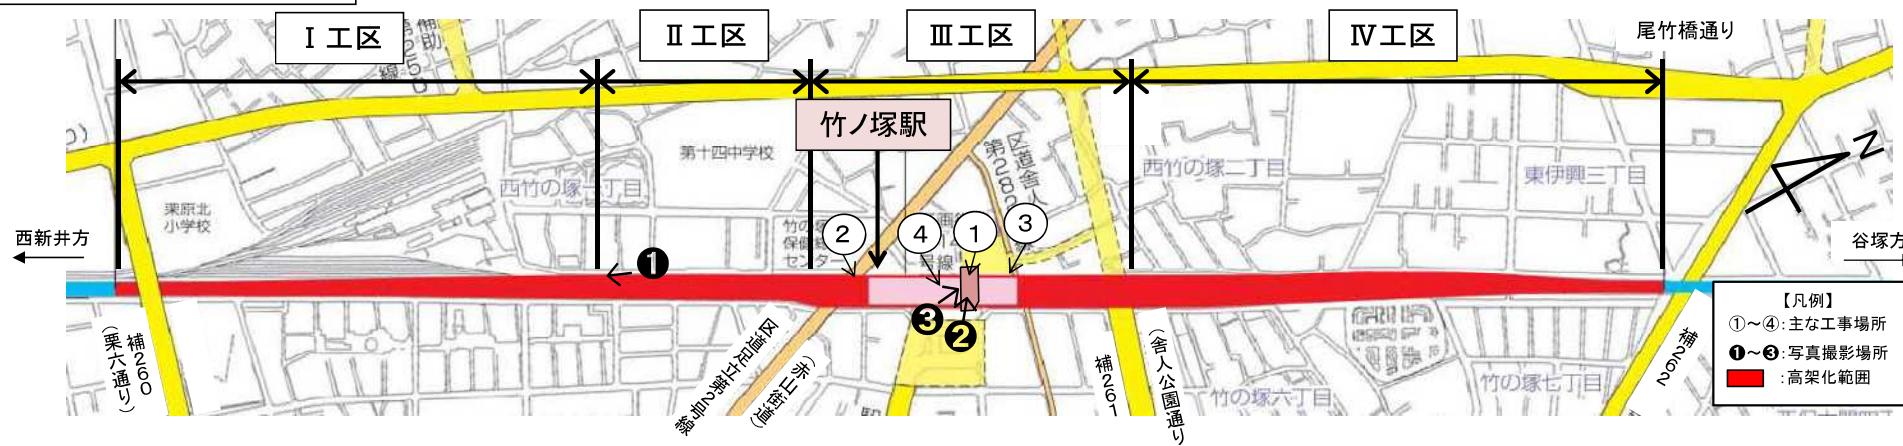

※本資料についてご不明な点は、東武鉄道竹ノ塚工事事務所(TEL03-6807-1461)にお問い合わせ下さい。また、各工区の詳細は各工区の連絡先までお問い合わせ願います。
